

Présentation de projets menés dans le cadre d'ID77 – Offres Assainissement dans ID77 : l'exemple de Sourdun

Chef de file : Le Département/Direction de l'Eau, de l'Environnement et de l'Agriculture (DEEA)

Offre ID77 : C15 – Mise en œuvre d'un projet d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales)

Intervention : Pierre LAINÉ ingénieur au SATESE à la DEEA

Sommaire

1. **Rappel : Les offres assainissement ID77**
2. **Présentation du contexte de la commande de la commune de Sourdun (cas concret – offre C15)**
3. **Déroulé chronologique de l'appui technique apporté à la commune de Sourdun**

1. Les offres assainissement du catalogue (1/2)

- ✓ **C15:** Mise en œuvre d'un projet d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales)

Ingénierie opérationnelle de projet d'études amont (historique important auprès des collectivités éligibles via anciennes conventions d'ATD* définies par décret de 2007 révisé en 2019 et caduques depuis la création du GIP):

-> **Etat des lieux** (cf. données SATESE en partie)+ **définition du besoin**
+ **mise en relation des acteurs** (Agence de l'eau, police de l'eau, exploitant, maître d'ouvrage)

-> **Rédaction du cahier des charges** pour choix d'un AMO/analyse des offres

-> Appui pour les demandes de subventions

-> Suivi de l'étude et réunions d'animation

* ATD= Assistance Technique Départementale

1. Les offres assainissement du catalogue (2/2)

- ✓ **C17:** Accompagner pour la prise de compétence eau et assainissement


-> **appui similaire à C15** pour le lancement d'études de gouvernance nécessaire à la prise de compétence eau et assainissement des collectivités au plus tard en 2026 (cf. Lois NOTRé, Ferrand et 3DS).

2. Présentation du contexte de la commande de la commune de Sourdun (cas concret – offre C15) (1/3)

- Localisation de Sourdun



Source : Larousse

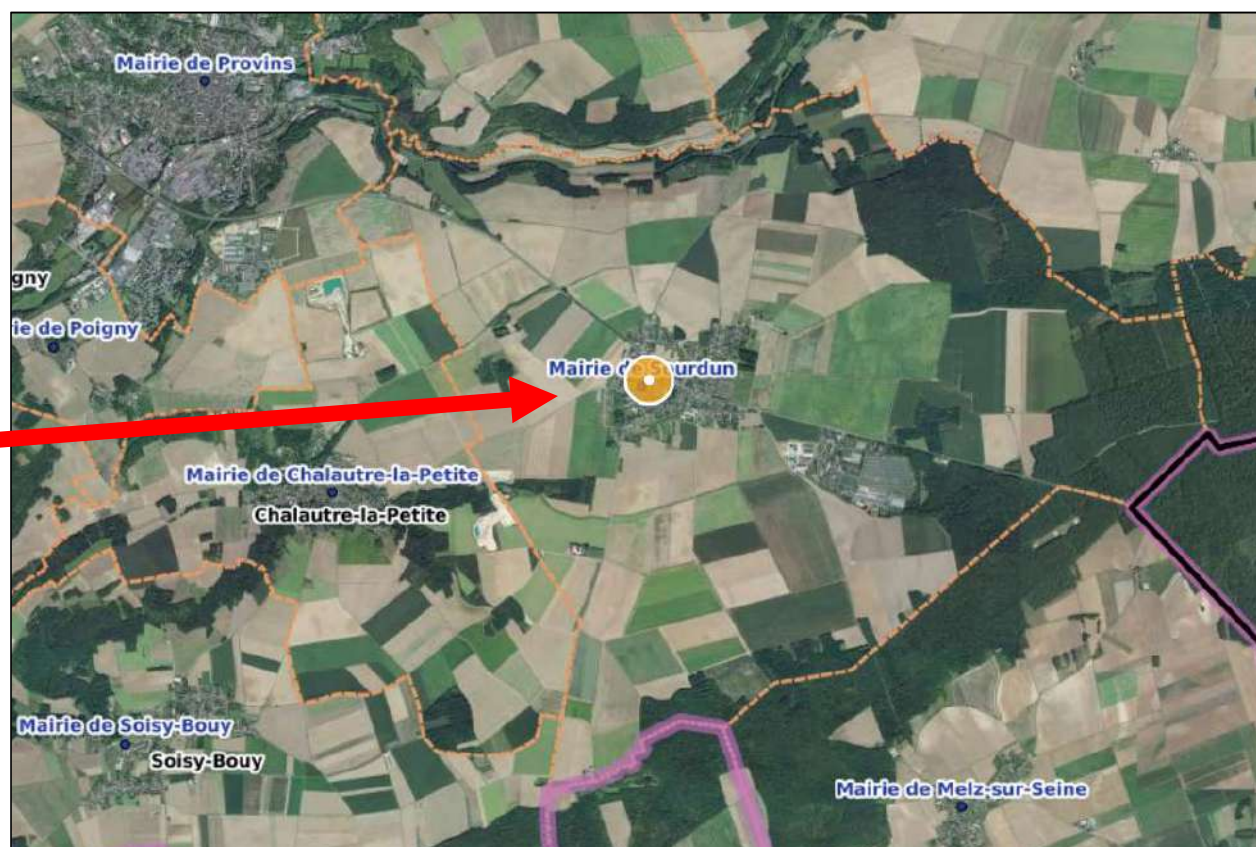

Source : géoportail

2. Présentation du contexte de la commande de la commune de Sourdun (cas concret – offre C15) (2/3)

- **Station d'épuration vieillissante** (construite en 1983), de type boues activées traitant les effluents d'un réseau unitaire
- **Fonctionnement non satisfaisant** depuis plusieurs années (cf. SDA et suivi SATESE) : non conçue pour traiter les eaux usées jusqu'à la pluie courante (pluie mensuelle).
- Commune interpellée par les voisins de la station, notamment lors de l'évacuation des boues : **gênes visuelle, auditive et surtout olfactive.**
- **Problèmes structurels récents**, illustrant le vieillissement des ouvrages : colmatage des lits de séchages et panne du pont racleur

2. Présentation du contexte de la commande de la commune de Sourdun (cas concret – offre C15) (3/3)




Bassin d'aération et clarificateur

Lits de séchage équipés de bâches filtrantes




3. Déroulé chronologique de l'appui technique apporté à la commune de Sourdun (1/4)




- **1^{er} trimestre 2021** : la commune a pris contact avec le SATESE pour bénéficier d'un appui technique dans le but de reconstruire sa station d'épuration.
- **Octobre 2021** : réunion d'échanges entre le SATESE, la commune, la police de l'eau (DDT) et l'exploitant (Veolia Eau) afin de préciser la commande.

3. Déroulé chronologique de l'appui technique apporté à la commune de Sourdun (2/4)



- **Février 2022** : réunion de présentation du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) pour le choix d'un AMO (Assistant à Maîtrise d'Ouvrage) pour la mise aux normes du système d'assainissement (station d'épuration + réseau de collecte).
- **Fin février 2022** : prise de délibération par la commune pour lancer la mission d'AMO (modèle transmis).

3. Déroulé chronologique de l'appui technique apporté à la commune de Sourdun (3/4)




- **Mars-avril 2022** : consultation. Appui à la procédure de dématérialisation du marché public sur un profil acheteur.
- **Fin mai 2022** : présentation de l'analyse des offres à la commune et validation du résultat par la commune.
- **Fin mai/ juin 2022 (en cours)** : aide à la notification des candidats + constitution des demandes de subventions (modèles transmis)

3. Déroulé chronologique de l'appui technique apporté à la commune de Sourdun (4/4)

A venir :

- **Juillet ou septembre 2022** : réunion de démarrage de la mission d'AMO (appui de la commune par le SATESE)
- **1^{er} semestre 2024** : démarrage mission de MOE (Maîtrise d'Œuvre) (appui de la commune par le SATESE)
- **1^{er} semestre 2025** : lancement de la consultation de travaux par la commune avec son maître d'oeuvre.



Merci pour votre attention



ID77
Hôtel du Département
CS 50377
77010 Melun cedex
Tél. 01 64 14 73 56

id77.fr
